

# S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

## Aniversario de LOS CATUTOS

Localidad: LOS CATUTOS

Aniversario: 15/08/1997

Categoría: Comisión de Fomento

Autoridades: Presidente - Sr. Ramón Mercado


Habitantes: 0



Escudo de la localidad



Fotografía de la localidad

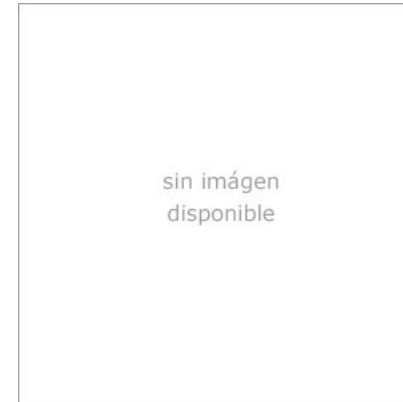

Presidente - Sr. Ramón Mercado

Cantidad de Obras: 12

Monto Total: \$ 8.198.132,21

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
CONTRATACIÓN DE M.O PARA OBRAS DE DISTRIBUCION Y Aº Pº - CONVENIO MARCO 2011/2012 (2º PERIODO) - ZONA OESTE	2112 RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	1.210.000,00	05/04/2013	19/06/2015	64,68	58.826	97	FINALIZADA	FINALIZADA	SE CONTRARÁ A UNA EMPRESA QUE DEBERÁ PROVEER LOS EQUIPOS, LAS HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y LA MANO DE OBRA NECESARIAS PARA EJECUTAR OBRAS POR ADMINISTRACIÓN, PARA SATISFACER DEMANDAS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE DICHAS ZONAS DE LA PROVINCIA DE NEUQUÉN DONDE EL EPEN BRINDA EL SERVICIO ELÉCTRICO Y EN LAS ÁREAS RURALES DE INFLUENCIA. LAS OBRAS A EJECUTAR CONSISTEN EN TENDIDOS ELÉCTRICOS URBANOS Y RURALES DE BT Y MT.	E.P.E.N.	E.P.E.N.
CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA OBRAS DE DISTRIBUCIÓN Y Aº Pº AÑO 2011-2012 U.S.R.OESTE		1.210.000,00	15/03/2011	09/11/2012	57,00	0	0	FINALIZADA		EL MONTO ORIGINAL REPRESENTA N MONTO TOPE CONTRACTUAL EL CUUAL PUEDE O NO ALCANZARSE. EN ESTA ZONA SE CONTRATO MANO DE OBRA POR LA SUMA DE \$ 689.725,02 SIN SUPERAR EL TOPE.	E.P.E.N.	E.P.E.N.
REESTRUCTURACION LBT EN ACCESO A LOS CATUTOS		42.376,64			0,00	0	0	FINALIZADA			E.P.E.N. DISTRIBUCION	E.P.E.N. DISTRIBUCION
REESTRUCTURACION LBT EN PARAJE LOS CATUTOS DEL DEPTO. ZAPALA		23.992,12			0,00	0	0	FINALIZADA			E.P.E.N. DISTRIBUCION	E.P.E.N. DISTRIBUCION
S.E.E. COMUNINDAD QUINCHAO EN LOS CATUTOS		37.004,65			0,00	0	0	FINALIZADA			E.P.E.N. DISTRIBUCION	E.P.E.N. DISTRIBUCION
SEE A 21 LOTES ETAPA 1 LOS CATUTOS		120.138,80			0,00	0	0	FINALIZADA			E.P.E.N. DISTRIBUCION	E.P.E.N. DISTRIBUCION
CONSTRUCCIÓN DE 4 MODULOS HABITACIONALES	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA	450.000,00			39,85	0	0	EN EJECUCIÓN			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
CONSTRUCCIÓN DE SALA VELATORIA	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA	250.000,00			48,75	0	0	EN EJECUCIÓN			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
CONEXIÓN DOMICILIARIA DE GAS	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA					0	0	EN PROYECTO			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS SANITARIOS	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA					0	0	EN PROYECTO			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
SISTEMA DE AGUA POTABLE	5509 RSE - LINDERO ATRAVESADO					0	0	EN PROYECTO			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
ESCUELA PRIMARIA 37		4.854.620,00	30/04/2016	28/10/2016	0,00	0	0	A INICIAR	A INICIAR	AMPLIACIÓN ESTABLECIMIENTO ESCOLAR	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS
